質　問　回　答　書　③

工事番号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
	【共通】		
1	共通-1 、質疑他	支給材については、町から受け取る（ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場での引き渡し）とありますが、現場でのご支給としていただけないでしょうか。	可能ですが、今後協議とさせて頂きます。プレカットは本工事です。（ただし、工場での引き渡しの場合は近隣のプレカット工場を想定しています。）
	【外部仕上】		
2		屋根点検用ﾀﾗｯﾌﾟが必要であれば､仕様､詳細､設置ﾌﾟﾗﾝをご指示下さい。	不要です。脚立での登り下りを想定しています。
3	A-015､020､083	参考内訳書に記載の地流しについて、部分詳細図3 OD-22の地流しが該当すると考えてよろしいですか。 その場合、A-020図面では外構範囲部分に設置されていますので、排水経路も含め、別途と考えてよろしいですか。	よろしいです。 本工事としてください。
4	A-015	駐輪場の既製ｶｰﾎﾟｰﾄ､ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰは外構工事(別途工事)と考えてよろしいですか。	よろしいです。
5	A-015	外部仕上表に記載の竪樋(ｱﾙﾐ φ89)は該当無しと考えてよろしいですか。	A091,094参照ください。X6通り及びX8通り南側Y字の樋部分はアルミ製にてお見込みください。
6	A-111	鉄骨架台1 床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの仕様は参考内訳書よりｽﾃﾝﾚｽと考えてよろしいですか。	よろしいです。
	【内部仕上】		
7	A-025～38 S-31-7､8	2階上部水平構面 構造合板t24の範囲が構造図と意匠矩計図で相違しております。 天井ﾎﾞｰﾄﾞ仕上ﾎﾞｰﾄﾞ施工範囲に必要と考えてよろしいですか。	2階上部水平構面 構造合板t24の範囲は構造図を正としてください。（S-31-7.8は中間梁レベルの図面になります。構造図正）
8	A-060	便所踏込部分に記載のある壁見切(化粧ｹｲｶﾙ-NAD塗装)の仕様をご指示下さい。	スチール　FB-6×30　SOPでお見込みください。
9	A-025	矩計図(1)電気･機械室天井内にﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞM16 SOPとありますが､天井内の為､SOP塗装は不要と考えてよろしいですか。	よろしいです。錆止め塗装までとしてください。
10	A-026	矩計図(2)HCWC3天井内に母屋 自然保護塗料の記載がありますが､見掛かり部のみと考えてよろしいですか。	よろしいです。
11	A-015､056	1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室天井断熱材面の仕上が下記のように相違しております。 ･仕上表01 : 現し ･天井伏図 : EP 仕上表01の現しを正と考えてよろしいですか。	よろしいです。

質　問　回　答　書　③

工事番号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
12	A-016、050、042	1階SKの壁仕上が下記のように相違しております。 ・仕上表02 : (LW3b)耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ NAD ・展開図2(1階-2) : (LW-14)化粧ｹｲｶﾙ板 ・1階平面詳細図(1) : (LW-14)化粧ｹｲｶﾙ板 展開図、平面詳細図の化粧ｹｲｶﾙ板を正と考えてよろしいですか。 上記のように仕上表と展開図、平面詳細図で相違がある場合、平面詳細図を正と考えてよろしいですか。	よろしいです。
13	A-042	1階Y1b・X1-4通り間等のR付壁について、多角形(※曲面ではない)と考えてよろしいですか。	よろしいです。ただし、施工においてなるべく角が出ないよう配慮したいので、施工の際、協議をお願いします。
14	A-086	吹抜け部手すり詳細(ID-26)について、木見切:10x10とありますが、樹種が不明です。米栂と考えてよろしいですか。	よろしいです。
15	A-014	外壁断熱面防火ｺｰﾄの厚みが不明です。t3(ｴｽｹｰ化研ﾀﾞﾝｾﾗﾎﾞﾝ程度) 考えてよろしいですか。	よろしいです。
16	A-050	1階給湯室他壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙの仕様は化粧ｹｲｶﾙ板t3.0(ｱｲｶ工業:ｾﾗｰﾙ同等)と考えてよろしいですか。	よろしいです。
17	A-029、038	1階執務室1、待合、廊下2aの折上天井側面:岩綿吸音板の仕様が下記のように相違しております。 ・矩計図(5) : 岩綿吸音板A ・矩計図(14) : 岩綿吸音板B 岩綿吸音板Aを正と考えてよろしいですか。	よろしいです。（Aが正）
18	A-016	消火水槽床・壁:ｹｲ酸質系塗布防水は、ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽS＋P程度と考えてよろしいですか。	よろしいです。
19	A-014、084	地下ﾋﾟｯﾄ天井ｽﾗﾌﾞ底断熱:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板の厚みが下記のように相違しております。 ・仕上特記仕様書 16.特記事項 : t25 ・部分詳細図4(内部1) ID-05 : t50 t50を正と考えてよろしいですか。	よろしいです。（t50が正）

質　問　回　答　書　③

工事番号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
20	A-029～031	ﾋﾟｯﾄ内に、ﾁｬﾝﾊﾞｰｹｲｶﾙ板t9+9 LGS下地 断熱材の図示がありますが、該当範囲はY1・X6-11通り間と考えてよろしいですか。また、断熱材の仕様は硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt25と考えてよろしいですか。	よろしいです。
21	A-017、027	2階議場他OAﾌﾛｱ下の断熱材t15の仕様が不明です。ｴﾚﾒﾝﾄ図(1)F-9よりﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑのこととし、厚みはｴﾚﾒﾝﾄ図(1)F-9のt25を正と考えてよろしいですか。また、該当範囲はOAﾌﾛｱ下全範囲と考えてよろしいですか。	A-027に示すとおり、OA下全面でt25です。 仕様はポリスチレンフォームでお見込みください。
22	A-048、049	壁種別図の凡例について、凡例:青実線、青二点鎖線の仕上がFCCとありますが、展開図1(1階-1)ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ他ではACCとあり相違しております。屋内塗装に関しては、展開図を正と考えてよろしいですか。	よろしいです。
23		矩計図(1)(12)に図示のある、LGS間仕切頂部～RC梁取合部の通しｱﾝｸﾞﾙの施工範囲は下記の様に考えてよろしいですか。 ・1階 Y1b通,X1～X1+5,150 (HCWC2～授乳室間) ・1階X11通,Y2-465～Y4 (女子更衣室～宿直室間) 他に必要な範囲があればご指示下さい。	左記に加え、Y1b通りX3～4通りです。（エレメント番号に従いスラブ面まで壁を施工したい場合において、梁位置との壁の関係により通しアングルを設けています。別途、LGS固定のご提案があれば協議後の変更も可能です。）
24	A-027～028 M-018～023	矩計図(3)(4)について、1階天井ﾌﾄｺﾛ内の空調用ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽの図示がありますが、設備図のﾁｬﾝﾊﾞｰﾘｽﾄとは別の部分でしょうか。建築で必要なGB-R12.5+9.5の施工箇所及び施工範囲毎の寸法が不明です。ご指示下さい。	床吹出口用のチャンバーになります。 各吹出口（A-021.046参照）において梁－梁（もしくは小梁）間にてお見込みください。（Y1側４か所、Y3付近２か所、X6吹抜側２か所）
25	A-033 A-081	部分詳細図1(外部1)について、GB-Rt21+21 横胴縁20x40x@455と図示がありますが、矩計図(9)の耐火構造壁仕上面合わせ胴縁20x40の事と考えてよろしいですか。	耐火構造の壁と一般部の壁が同面で連続する部分において、壁に段差を設けないよう下地胴縁とは別に設けています。
26	A-015	1F風除室1、2 傘立ては別途工事と考えてよろしいですか。 上記傘立てが本工事であれば、仕様、詳細、程度、か所数をご指示下さい。	よろしいです。
27	A-015	内部仕上表 1F待合ｺｰﾅｰにﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの記載がありますが、天井伏図等に記載がありません。不要と考えてよろしいですか。 必要であれば、設置ﾌﾟﾗﾝ及び耐荷重をご指示下さい。	よろしいです。（A-042掲示板（Feボード）のみとしています）
28	A-016	内部仕上表 2F廊下4a、b、cにﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの記載がありますが、天井伏図等に記載がありません。不要と考えてよろしいですか。 必要であれば、設置ﾌﾟﾗﾝをご指示下さい。	よろしいです。（A-047掲示板（Feボード）のみとしています）

質　問　回　答　書　③

工事番号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
29	A-015	内部仕上表 1F大会議室にｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの記載がありますが、平面詳細図等に記載がありません。不要と考えてよろしいですか。 必要であれば、仕様、詳細、程度、設置ﾌﾟﾗﾝをご指示下さい。	よろしいです。（「■2回目入札時からの変更点」No28より変更としました）
30	共通-4 、A-1	ｱｰﾁAのﾓｯｸｱｯﾌﾟは、加工場でのﾓﾃﾞﾙﾓｯｸｱｯﾌﾟとして集成材（東濃桧以外）にて製作してもよろしいですか。	よろしいです。設計書通りの仕様の場合、アーチ加工は1アーチフレームとして、モックアップがそのまま使えるのであれば、本部材として利用することも可能です。
31	A-015	ｱｸﾘﾙ系低汚染砂状仕上塗材 白川茶葉混入の詳細が不明です。詳細をご指示下さい。 （材料入手先、混入量、施工業者　等）	地域企業との協働を検討しております。 弾性系 低汚染砂状仕上塗　アイカジョリパッドJQ-200内装用不燃タイプ程度の金額をお見込みください。
	【建具】		
32	A-3	特記仕様書(意匠)-3、16章.建具工事、03.見本の製作等で建具見本の製作と特殊な建具の仮組みが製作するに適用印がありますが下記項目をご指示下さい。 ・該当建具符号 ・製作建具寸法 ・ｶﾞﾗｽの仕様、厚み、施工範囲	作製部は、木製建具におけるすべり出し窓と、ヘーベシーベの設定部分各１枚分をお考えください。詳細は現場にて協議願います。図面記載の各建具性能値担保や使用木材の指定（東濃桧）が可能なことを前提とします。
33	A-066 A-082 A-027	質疑回答No.42、AW-104、105他の木製額縁は米ﾂｶﾞ程度と回答をいただきましたが部分詳細図2(外部2)、OD-14、15でﾋﾉｷとあり矩計図(3)でもﾋﾉｷと記載されていることから図面通りﾋﾉｷと考えてよろしいですか。米ﾂｶﾞの場合はｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽも同じく変更となるのでしょうか。併せてご指示下さい。	失礼しました。よろしいです。図面記載通りの桧にてお見込みください。 （内訳書上も桧にて算出しております。右下番号P183等参照）
34	A-068 A-069	質疑回答No.47、建具表(3)、(4)、WD-103、207~211の建具枠は水性塗料(ｳｯﾄﾞｴｲﾄﾞｶﾗｰA)と回答をいただきましたが、建具表ではWPとなっているため図面通りWP塗装と考えてよろしいですか。(外部WD-201~206は木製建具詳細図より水性塗料)	よろしいです。
35	A-072	質疑回答No.49で枠廻りの防水ｼｰﾄに関して該当建具符号をご指示下さい。	木造外壁部（２階）のアルミ、鋼製建具全ての符号になります。
36	A-072	ｱﾙﾐ製建具詳細図(3)、枠廻りC-60×30の施工範囲、該当建具符号をご指示下さい。	AW-204（防火設備部）1か所です。（A-072の206は誤記です）
37	A-074	木製建具詳細図(2)、付柱は下記の様に考えてよろしいですか。 ・ﾋﾉｷ WP塗装	付柱は左記の通りお見込みください。A074等のふさぎ材（建具工事）については外部に面するため、建具同様の水性塗料をお見込みください。

質　問　回　答　書　③

工事番号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
	【外構】		
38	S-401-1	外構（既存井戸周辺）の山留に関連して、参考として10mとありますが、山留についての検討をしたいので下記の項目についてご教示ください。 ・既存井戸改修工事（別途工事）の内容が分かる図面の配布をお願いいたします。 ・既存井戸改修工事（別途工事）の予定工事時期がありましたらご教示下さい。 ・また井戸周辺に関連する浄化槽の施工予定時期もありましたら併せてご教示下さい。 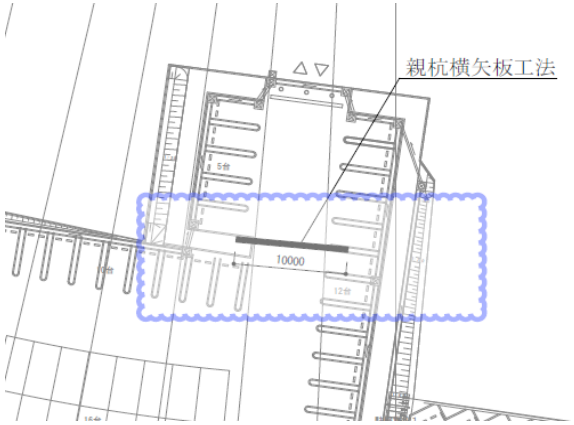	浄化槽周囲は十分な空きスペースがあるため，法付けオープンカット工法で想定しています。1辺山留を見込んでいるのは，近隣に既存の井戸があり，それを保護する意図で想定しています。想定で10ｍは1辺ですが，山留の安定のために10ｍをコの字に配置する方法もあるかと思います。S-401-1は参考図であり，土留めについても指定仮設ではなく任意仮設のため，施工者様で安全を担保できる方法にてご提案頂いて結構です。 掘削深さはH3.52mであり山留めの深さも掘削深さと同様にH3.52mとなります。 施工時期は2025年1月～3月を想定しています。
