白川町　橋梁長寿命化修繕計画



1 号立体ﾗｰﾒﾝ桟道杭式道路橋

令和 7 年 3 月

岐阜県 白川町 建設環境課

目　次

1　長寿命化修繕計画の目的・・・・・・・・・　1

（1）現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

（2）課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

（3）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

2　長寿命化修繕計画の基本方針・・・・・・・　2

（1）基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

（2）定期点検・診断・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

（3）計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

（4）対策の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

（5）コスト縮減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

（6）新技術等の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

（7）集約化・撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

（8）橋梁補修DIY・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

（9）予防保全型の維持管理への移行・・・・・・・・・・　7

（１０）フォローアップ・・・・・・・・・・・・・・・・　8

（１１）個別の構造物毎の事項・・・・・・・・・・・・・　8


3　白川町橋梁個別施設計画・・・・・・・・　9

1　長寿命化修繕計画の目的

(1)　現状

・白川町は現在304橋の町道橋を管理しています。

・そのうち約８割の橋梁が、１９６０年度頃から１９９０年頃まで集中して建設されました。

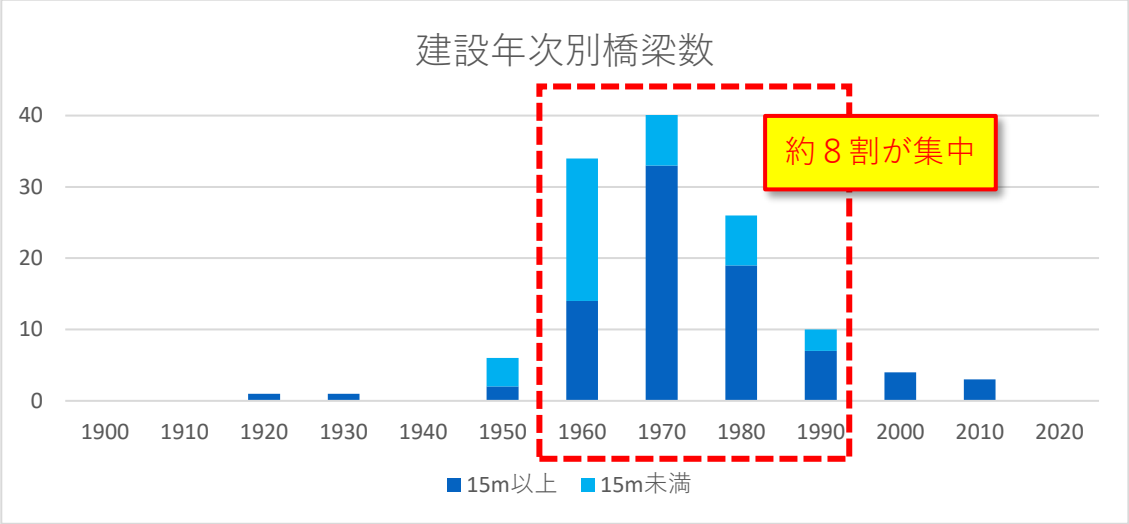


※建設年次不明橋梁数を除く

(2)　課題

・現在、建設後５０年以上経過した橋梁は、全体の約４０％となっています。

・１０年後には約５０％、２０年後には約８０％、３０年後には約９０％と、今後高齢化する橋梁の割合が急速に増加し、適切な対策を行わない場合、維持管理に膨大な費用の発生が予想されます。

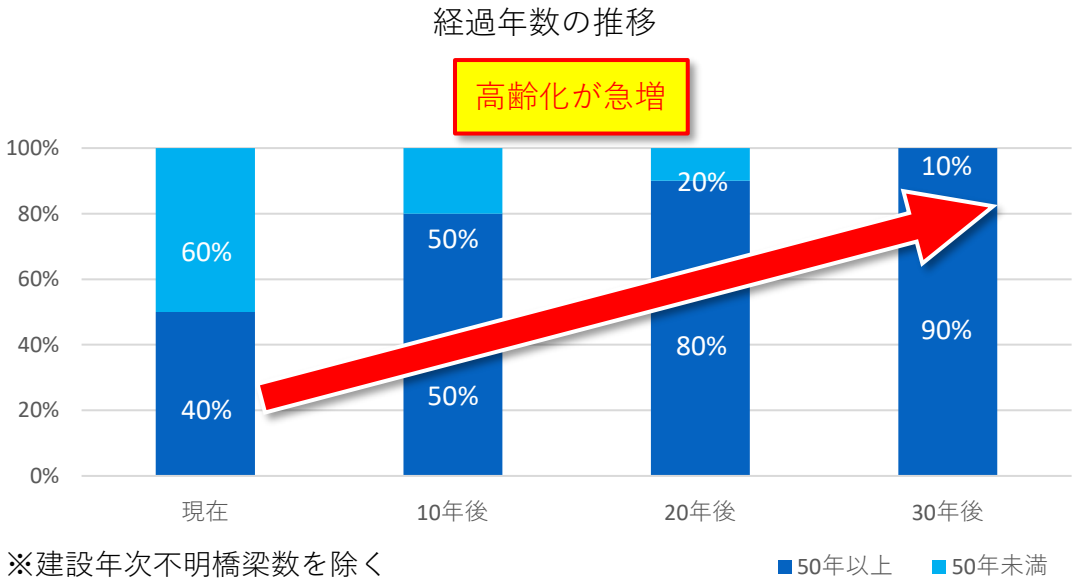

※建設年次不明橋梁数を除く

1　長寿命化修繕計画の目的

(3)　目的

・今後老朽化する橋梁の急速な増加に対応するため、長寿命化修繕計画を策定することで、維持管理の適正化・効率化や、費用の縮減を図り、橋梁など地域の道路網の安全性・信頼性を持続的に確保します。


2　長寿命化修繕計画の基本方針


(1)　基本方針

・これまでの「壊れたら直す」事後的な維持管理から、「壊れる前に直す」予防的な維持管理への転機を図ります。


・［点検］→［診断］→［措置］→［記録］のメンテナンスサイクルを構築し、継続的にサイクルを繰り返します。




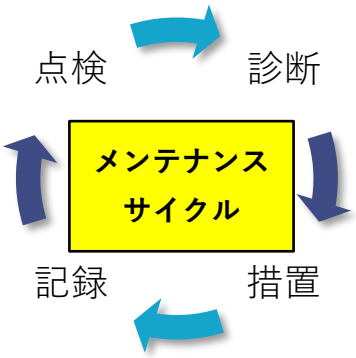

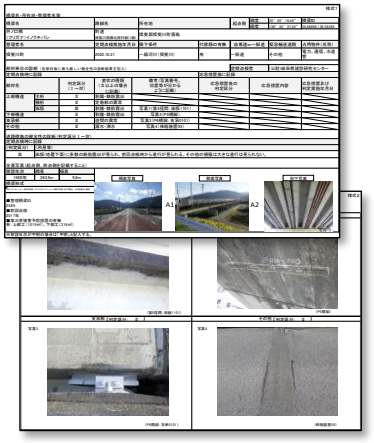

・長寿命化修繕計画により、計画的な維持管理と長期的な維持管理費用の縮減を図ります。また計画は、必要に応じ見直しを行っていきます。

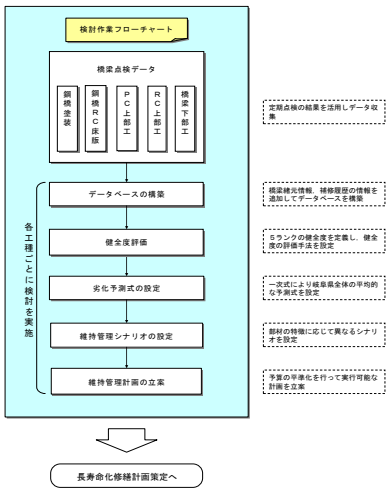

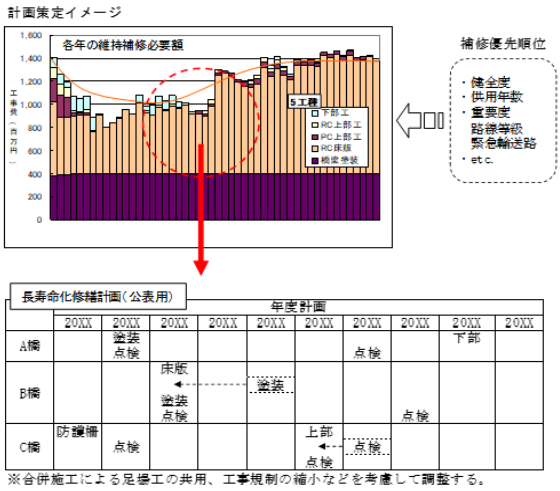

2　長寿命化修繕計画の基本方針

(2)　定期点検・診断

・定期点検は、下記の定期点検要領等に基づき、５年に１回の頻度で近接目視のよる点検を実施し、下表に示す４段階で区分した健全度で評価します。

・点検結果の電子化を図り、今後の維持管理の基礎資料として蓄積します。

道路橋定期点検要領（令和６年３月　国土交通省　道路局）

岐阜県橋梁点検マニュアル（令和４年３月　岐阜県県土整備部　道路維持課）

※点検要領等が改定された場合、最新の要領に基づき実施します。

判定区分		損傷の状態	健全性
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態	良い
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる事が望ましい状態	
Ⅲ	早期措置全段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	悪い



葛牧橋



小草場橋


近接目視による点検状況（橋梁点検車）

2　長寿命化修繕計画の基本方針

(3)　計画期間

・定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるよう計画期間は１０年を基本とします。

・点検結果等を踏まえ、必要に応じ計画の見直しを行います。

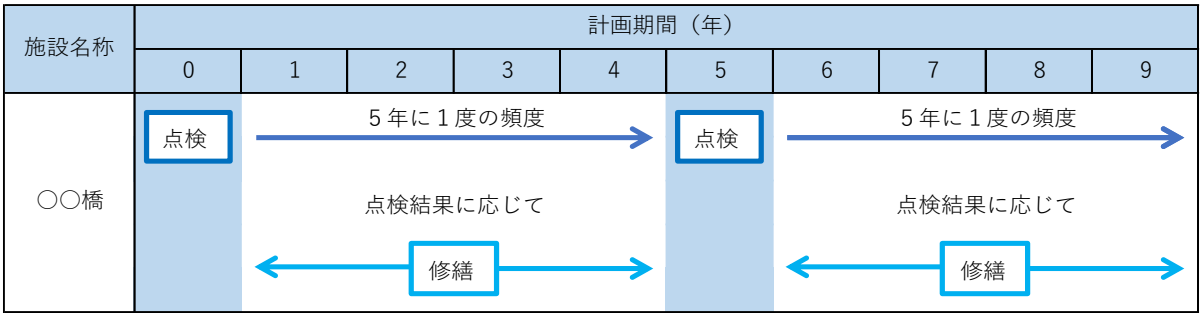

(4)　対策の優先順位

・点検結果により、健全性の悪い橋梁「判定区分Ⅲ、Ⅳ」を優先して対策を検討します。

・また、路線重要性、迂回路の有無、第三者被害の恐れなどから総合的に勘案したうえで、優先的に対策を実施します。

・「判定区分Ⅳ：緊急措置段階」の橋梁は、ただちに対策を実施します。

道路橋名	架設年次	橋　長	点検年度	判定区分	対策内容
小倉橋	1983	19.1	2021	Ⅳ	R8年度撤去予定
小倉線３号橋	不明	6.5	2022	Ⅲ	R5補修済
栩ノ木線３号橋	不明	3.7	2022	Ⅲ	R8年度補修工事予定
上山線１号橋	不明	6.2	2022	Ⅲ	R8年度補修工事予定
中落橋	不明	12.1	2022	Ⅲ	撤去・集約予定
向山橋	1967	10.3	2022	Ⅲ	撤去・集約予定（近隣にBPの橋梁が架設）
若宮橋	1993	21.0	2021	Ⅲ	R7年度補修工事予定
待瀬橋	1977	16.0	2020	Ⅲ	R7年度補修工事予定
砂畑橋	1975	31.0	2020	Ⅲ	R7年度補修工事予定
小坂橋	不明	3.6	2020	Ⅲ	R7年度補修工事予定
下古野日向線１号橋	不明	4.3	2020	Ⅲ	R6補修済
小井戸大野台線２号橋	不明	7.5	2019	Ⅲ	R7年度補修工事予定
無渡線１号橋	1966	10.6	2019	Ⅲ	R5補修済

2　長寿命化修繕計画の基本方針

(5)　コスト縮減

・今後、橋長が短くかつ構造が単純な橋梁について、直営点検等の実施を検討することで点検費用の縮減を目指します。

(6)　新技術等の活用

・令和15年度までに、管理する橋梁304橋の内10橋の橋梁について、循環式ハイブリッドブラストの新技術を活用した修繕を進め、従来技術と比較して**、約10百万円のコスト縮減**を目指します。鋼橋の防食機能の劣化及び腐食に伴い、塗装塗替えを実施するにあたって、従来工法であるサンドブラストではなく、循環式ハイブリッドブラスト工法などの新技術（NETIS）を採用することで経済性の向上及び環境負荷の低減が期待できます。また粉塵抑制ができるため作業環境（安全性）の向上の期待ができます。（QS-150032-VE、KT-230028-A）作業環境や施工規模によって、ミストブラスト（湿粒ブラスト工法）を採用することも検討ます。（CB-190010-A）ただし、点検結果により優先順位が変わった場合は下記の対象橋梁を必要に応じて修繕計画を見直しを行います。

道路橋名	架設年次	橋　長	幅　員	判定区分
白川橋	1926	115	3.9	II
下畑橋	1970	30.5	2.5	II
大洞橋	1969	35.5	2.9	II
三川日陰橋	1969	23.5	3.7	II
島大橋	1985	133.2	5.5	II
小原橋	1998	59.2	10.1	II
思案橋	1975	26.3	5.2	II
河東橋	1984	108.7	5.5	II
水口橋	1970	12.6	4.7	II
洞山橋	1971	10.3	4.7	II

2　長寿命化修繕計画の基本方針

（7）　集約化・撤去

・今後、迂回路が存在し交通量の少ない以下の橋梁について、集約化・撤去又は機能縮小を検討し、令和１５年度までに４橋の集約化・撤去を検討、その内１橋を実施し、**約26百万円**のコスト縮減を目指します。

道路橋名	架設年次	橋　長	点検年度	判定区分	対策内容
小倉橋	1983	19.1	2021	Ⅳ	R8年度撤去予定
中落橋	不明	12.1	2022	Ⅲ	撤去・集約予定
向山橋	1967	10.3	2022	Ⅲ	撤去・集約予定（近隣にBPの橋梁が架設）
鉱山橋	1965	34.0	2022	Ⅱ	撤去・集約予定（吊り橋）

（8）　自治体職員による橋梁補修DIY（直営施工）の活用

・２巡目の点検が終わり、健全性Ⅲの修繕も完了する見込みであるが、健全性Ⅱの橋梁が多く存在しています。今後は予防保全型による管理を進めるため、橋梁補修の橋梁補修DIY（直営施工）、材料費と機械損料のみで実施できることから、修繕費のコスト縮減を目指す。補修計画に該当する13橋で実施し、**約1.6百万のコスト縮減**を目指します。

対象工種：水切り設置工

道路橋名	架設年次	橋　長	幅　員	判定区分
道木割谷線１号橋	不明	4.3	3.3	Ⅱ
広島橋	不明	4.3	8.8	Ⅱ
赤河線１号橋	不明	5.7	5	Ⅱ
赤河線２号橋	不明	3.8	4.9	Ⅱ
大谷橋	不明	5	4	Ⅱ
和良美野橋	不明	6	3.9	Ⅱ
林橋	不明	8	4.1	Ⅱ
新津橋	1970	6.4	4	Ⅱ
古田隆松線１号橋	1960	4	3.4	Ⅱ
井ノ洞線３号橋	不明	7.4	4	Ⅱ
小井戸大野台線３号橋	不明	6.95	9.3	Ⅱ
両神橋	不明	8	5.7	Ⅱ
栃本橋	不明	10.2	1.5	Ⅱ


2　長寿命化修繕計画の基本方針


(9)　予防保全型の維持管理への移行


・50年間の橋梁維持管理を、事後保全型から予防保全型に移行し、橋梁の長寿命化を図る。それにより、約30％（約20億円）のコスト縮減を図る。

　また、年度毎の維持管理費用を平準化させることで、財政への集中的な負担を軽減する。なお、この維持管理費用の算出は令和５年度までの点検結果及び令和６年度からの発注予定の補修工事、補修設計内容に基づき検討したものであり、今後は最新の知見、点検結果に基づいて都度見直しを行い、実態を踏まえた最適な計画に更新していきます。

点検実施数	判定区分			
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
304	137	154	12	1



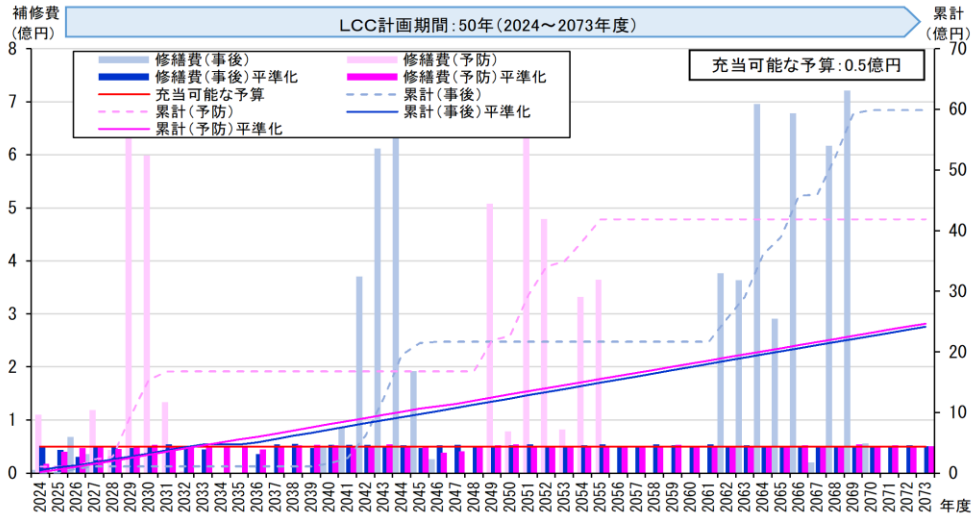

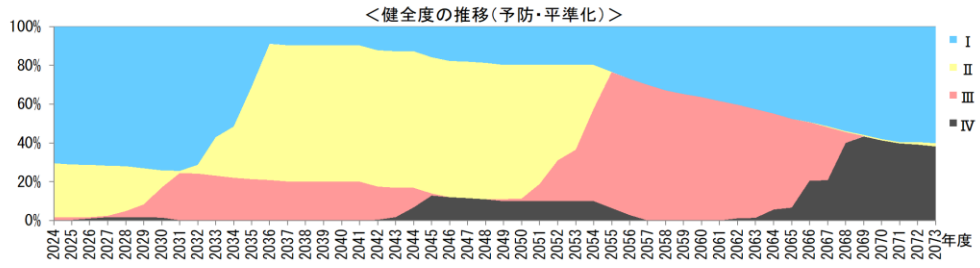

＜管理方法別修繕費用合計＞　百万円

	2024～2033	2034～2043	2044～2053	2054～2063	2064～2073	合計
事後保全型管理	110	1,120	940	741	3,079	5,989
予防保全型管理	1,679	0	1,810	699	0	4,188
予防平準化実施	455	506	490	506	509	2,465

	事後保全型管理	予防保全型管理	削減率	予防平準化実施
平均修繕費	1.2億円/年	0.8億円/年	30%	0.5億円/年

2　長寿命化修繕計画の基本方針

（9） フォローアップ

・定期点検等の実施により新たに発見された損傷については、その優先順位を考慮し、個別施設計画の見直し（フォローアップ）を行う。

〔10） 個別の構造物毎の事項

・計画期間における対策の実施時期は、別紙［３　白川町橋梁個別施設計画］のとおりです。

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
古屋敷橋	町道	不明	4	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.67566	137.27856	R4年	Ⅰ	R9年															
岩野線１号橋	町道	不明	3.9	1	3.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67702	137.28012	R4年	Ⅱ	R9年									○		その他補修工	R14年度	R14年度	3.9	
伊佐谷橋	町道	不明	11	6	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋 不明	白川町	35.68321	137.29519	R4年	Ⅰ	R9年															
新西ヶ洞橋	町道	1982	8.7	2	6.7	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋　ボックスカルバート 不明	白川町	35.69231	137.30873	R4年	Ⅰ	R9年															
桜橋	町道	1976	7.4	13	4.5	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67856	137.29493	R4年	Ⅰ	R9年															
休場線２号橋	町道	不明	5.4	1	3.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67502	137.2993	R4年	Ⅱ	R9年															
小伊佐線2号橋	町道	1977	6.3	1	5.2	ボックスカルバート -	白川町	35.68443	137.29472	R4年	Ⅱ	R9年															
丸八橋	町道	不明	12	1	3.3	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.69059	137.30647	R4年	Ⅰ	R9年															
大坪橋	町道	1971	5	1	4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.69239	137.30842	R4年	Ⅱ	R9年															
大蔵薙橋	町道	1982	7.8	3	4.7	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.69572	137.30713	R4年	Ⅰ	R9年															
福島橋	町道　切井黒川線（1級）	1972	7	1	4.6	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.55808	137.31151	R4年	Ⅰ	R9年															
黒谷橋	町道	不明	4.3	1	4.6	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.69699	137.31673	R4年	Ⅱ	R9年															
栗林橋	町道	1977	13.4	1	4.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.695	137.31596	R4年	Ⅱ	R9年															
松葉線２号橋	町道	1984	11.6	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.68125	137.29284	R4年	Ⅰ	R9年															
室原線1号橋	町道	不明	4.4	1	5.4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.6748	137.25304	R4年	Ⅱ	R9年															
成山中谷線1号橋	町道	1984	5.6	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.66219	137.2357	R4年	Ⅰ	R9年															
小伊佐橋	町道	1977	7	1	5.2	ボックスカルバート -	白川町	35.68371	137.29518	R4年	Ⅰ	R9年															
有本線5号橋	町道	不明	6	1	4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.69549	137.31646	R4年	Ⅱ	R9年															
桑原線１号橋	町道	不明	11.4	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.67666	137.29735	R4年	Ⅰ	R9年															
和泉白山線1号橋	町道	1972	6.2	3	7.3	ボックスカルバート -	白川町	35.5985	137.20843	R4年	Ⅱ	R9年															
和泉白山線3号橋	町道	不明	3.4	5	9	ボックスカルバート -	白川町	35.60316	137.19967	R4年	Ⅰ	R9年															
切井黒川線４号橋	町道　切井黒川線（1級）	1971	3.3	1	4.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.55992	137.31131	R4年	Ⅰ	R9年															
和泉白山線4号橋	町道	1983	3.8	1	9	ボックスカルバート -	白川町	35.61599	137.20758	R4年	Ⅰ	R9年															
和泉白山線5号橋	町道	不明	6.5	1	5.8	ボックスカルバート -	白川町	35.61867	137.20055	R4年	Ⅱ	R9年															
和泉白山線6号橋	町道	不明	2.5	1	8	ボックスカルバート -	白川町	35.62207	137.19563	R4年	Ⅰ	R9年															
和泉白山線８号橋	町道	不明	2	1	6.3	ボックスカルバート -	白川町	35.62493	137.19103	R4年	Ⅱ	R9年															
下平線1号橋	町道	不明	5.1	1	12.6	ボックスカルバート -	白川町	35.56076	137.23084	R4年	Ⅰ	R9年															
下平線2号橋	町道	不明	4.3	1	11.6	ボックスカルバート -	白川町	35.56128	137.23157	R4年	Ⅰ	R9年															
前坂線2号橋	町道	不明	3.5	1	4	ボックスカルバート -	白川町	35.54694	137.24583	R4年	Ⅰ	R9年															
赤河福地線3号橋	町道	不明	2.5	1	8	ボックスカルバート -	白川町	35.54661	137.26248	R4年	Ⅱ	R9年															
ヤマグチ橋	町道	不明	2.5	1	5	ボックスカルバート -	白川町	35.59258	137.33091	R4年	Ⅱ	R9年															
切井黒川線５号橋	町道　切井黒川線（1級）	1971	5.1	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.56064	137.31142	R4年	Ⅰ	R9年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
鹿折裏線1号橋	町道　鹿折裏線（その他）	1967	8.5	1	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋　不明	白川町	35.55361	137.31139	R4年	II	R9年															
小畑墓地線１号橋	町道 小畑墓地線	不明	5	1	4	（鋼）その他のプレートガーダー系橋(H桁)　不明	白川町	35.59275	137.29426	R5年	II	R9年															
桃の木線1号橋	町道　桃の木線(2級)	1973	2.8	1	3.6	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.55474	137.32943	R4年	I	R9年															
桃の木線2号橋	町道　桃の木線（2級）	1968	6.8	1	4	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　不明	白川町	35.55495	137.33073	R4年	II	R9年															
塔洞中の坊線1号橋	町道　塔洞中の坊線（2級）	不明	6.4	1	4.3	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.55326	137.31305	R4年	I	R9年															
鹿折線2号橋	町道　鹿折線（その他）	不明	2.6	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.5428	137.37047	R4年	I	R9年															
切井日陰橋	町道　塔洞日陰線（その他）	1994	14.7	1	5	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋　不明	白川町	35.54468	137.31095	R4年	I	R9年															
鹿折橋	町道　切井線（その他）	1961	12.7	1	7.3	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋　重力式橋台	白川町	35.54312	137.31693	R4年	I	R9年															
大正橋	町道	1977	45.2	2	1.9	（鋼）非合成単純鈑桁橋　重力式橋台	白川町	35.59059	137.20762	R4年	I	R9年															
小倉線3号橋	町道　小倉線（2級）	不明	6.5	1	4.7	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.54059	137.25886	R4年	III	R9年									○		洗堀防止　R14までに主桁・横桁工	R5年度	R5年度	済	R5年度補修済
赤河福地線4号橋	町道　赤河福地線（その他）	不明	7.4	2	5.2	ボックスカルバート　－	白川町	35.53642	137.26662	R4年	I	R9年															
赤河福地線5号橋	町道　赤河福地線（その他）	不明	7.4	1	5.8	ボックスカルバート　－	白川町	35.53276	137.26229	R4年	I	R9年															
三川茶碗線1号橋	町道　三川茶碗線（その他）	不明	4.6	1	5.3	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.55102	137.20882	R4年	I	R9年															
赤河日向線1号橋	町道　赤河日向線（その他）	不明	6.7	1	8.2	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.55805	137.24522	R4年	I	R9年															
赤河日向線２号橋	町道　赤河日向線（その他）	不明	9.3	1	9.7	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.55711	137.24784	R4年	I	R9年															
下新田線1号橋	町道　下新田線（2級）	不明	7.4	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.58368	137.26565	R4年	I	R9年															
下新田線2号橋	町道　下新田線（2級）	不明	7.4	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.58504	137.26561	R4年	II	R9年							○				断面修復　その他補修工	R12年度	R12年度	6.2	
下野橋	町道 下野線	1970	35.5	2	2.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋(H桁)　不明	白川町	35.5756	137.24856	R5年	I	R10年															
小坂線２号橋	町道　小坂線（その他）	不明	9.5	3	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋　半重力式橋台	白川町	35.57868	137.29034	R4年	I	R9年															
神田国頼線１号橋	町道	不明	7.6	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.58106	137.29146	R4年	I	R9年															
山の下橋	町道	1970	17.1	2	2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台	白川町	35.58262	137.3463	R4年	II	R9年															
砂畑線２号橋	町道	不明	3.1	1	1.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.64551	137.22033	R4年	I	R9年															
小洞線１号橋	町道	1989	9.5	1	3.8	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋　不明	白川町	35.59949	137.31035	R4年	I	R9年															
奥黒地線１号橋	町道	不明	6.5	3	5.4	ボックスカルバート　-	白川町	35.6017	137.32519	R4年	I	R9年															
柿反線２号橋	町道	不明	3.3	1	5.4	（ＲＣ）中実床版橋　　重力式橋台	白川町	35.60409	137.33554	R4年	I	R9年															
向山線２号橋	町道	不明	3	2	3.9	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.60182	137.33439	R4年	I	R9年															
馬橋草場線１号橋	町道	不明	4.3	3	4.4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.5941	137.32351	R4年	I	R9年															
砂畑線２号橋	町道	不明	3.1	1	1.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.64551	137.22033	R4年	I	R9年															
飛翔橋	町道	2012	41.4	1	8.2	（鋼）非合成単純鈑桁橋(耐候性）不明	白川町	35.59455	137.3086	R4年	II	R9年															
田の向線２号橋	町道	不明	2.6	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.60219	137.34615	R4年	II	R9年															
切井黒川線１号橋	町道	不明	4.4	1	5.4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.57302	137.31401	R4年	I	R9年															
切井黒川線２号橋	町道	不明	4	1	5.4	（ＲＣ）中実床版橋、（鋼）その他のプレートガーダー系橋　不明	白川町	35.58111	137.30948	R4年	II	R9年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
											Ⅰ～Ⅳ																
池尻橋	町道松葉線（その他）	1983	22.6	1	5.2	（鋼）非合成単純鈑桁橋（耐候性）　逆Ｔ式橋台	白川町	35.681	137.29211	R4年	Ⅱ	R9年															
切井黒川線3号橋	町道	不明	3.4	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋、（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.58411	137.31082	R4年	Ⅱ	R9年															
切井黒川線４号橋	町道	不明	6.5	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.58928	137.31147	R4年	Ⅰ	R9年															
前平線１号橋	町道	不明	4.5	2	7.5	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.59418	137.31881	R4年	Ⅱ	R9年										○	主桁　横桁　床版 下部工　その他	R15年度	R15年度	10.3	
鱒淵線1号橋	町道	不明	3	1	4.2	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.58753	137.34121	R4年	Ⅰ	R9年															
鱒淵線2号橋	町道	不明	5	2	4.1	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.58512	137.34442	R4年	Ⅰ	R9年															
鱒渕日向線１号橋	町道	不明	3.9	2	5.4	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.58763	137.34684	R4年	Ⅱ	R9年															
一の谷線１号橋	町道	不明	10.1	1	2.9	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.58416	137.33924	R4年	Ⅱ	R9年															
山の下線１号橋	町道	不明	4.4	1	2.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.5827	137.34631	R4年	Ⅰ	R9年															
中新田日陰2号橋	町道	不明	7.3	1	5.8	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.57924	137.3572	R4年	Ⅰ	R9年															
遠見場線1号橋	町道	不明	7.3	1	4.6	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.57546	137.36006	R4年	Ⅰ	R9年															
高橋	町道	1972	20.5	1	5.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.54779	137.26291	R4年	Ⅱ	R9年															
遠見場線２号橋	町道	不明	6.5	1	4.7	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.57361	137.35996	R4年	Ⅰ	R9年															
遠見場線３号橋	町道	不明	5.3	1	3.1	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.57393	137.36139	R4年	Ⅱ	R9年															
道木割谷線１号橋	町道	不明	4.3	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.58149	137.36347	R4年	Ⅱ	R9年															
丸場橋	町道	1955	13.8	1	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.57724	137.36844	R4年	Ⅰ	R9年															
栩ノ木線２号橋	町道	不明	4.5	1	3.9	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.5754	137.37062	R4年	Ⅰ	R9年															
栩ノ木線３号橋	町道	不明	3.7	1	4	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.57525	137.37103	R4年	Ⅲ	R9年			△○								洗堀防止	R8年度	R8年度	4.3	Ⅰ
栩ノ木線４号橋	町道	不明	8.4	3	4	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.57638	137.37892	R4年	Ⅰ	R9年															
栩ノ木線5号橋	町道	不明	7.1	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.5783	137.38447	R4年	Ⅱ	R9年															
栩ノ木線６号橋	町道	不明	3.4	2	3.7	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.57919	137.38533	R4年	Ⅰ	R9年															
大島線１号橋	町道	不明	10.4	1	4.6	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.57992	137.37322	R4年	Ⅰ	R9年															
増田橋	町道前畑線（その他）	1986	17.5	2	2.7	（鋼）非合成単純鈑桁橋 重力式橋台	白川町	35.58028	137.36444	R4年	Ⅰ	R9年															
西野線1号橋	町道	不明	5.6	2	4.8	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.5924	137.3008	R4年	Ⅰ	R9年															
奥黒地線２号橋	町道	不明	8.4	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.60534	137.32998	R4年	Ⅰ	R9年															
柿反線1号橋	町道	不明	8.3	3	4.3	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.60599	137.3342	R4年	Ⅰ	R9年															
頭谷線1号橋	町道	不明	8.4	1	4.4	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.60647	137.33393	R4年	Ⅰ	R9年															
大島線２号橋	町道	不明	11.5	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.57945	137.37395	R4年	Ⅰ	R9年															
古畑橋	町道	1966	13.5	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.5778	137.37139	R4年	Ⅱ	R9年															
奥黒地2号支線1号橋	町道	不明	5.5	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　　不明	白川町	35.60691	137.32981	R4年	Ⅱ	R9年								○			その他補修工	R13年度	R13年度	3.8	
丸山橋	町道	1962	11.7	1	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.60423	137.35081	R4年	Ⅰ	R9年															
上山線１号橋	町道	不明	6.2	1	3	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.58931	137.34239	R4年	Ⅲ	R9年		○									鋼材補修工	R7年度	R7年度	4.3	R7年度補修

3 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
											Ⅰ～Ⅳ																
赤谷橋	町道	1953	6	1	4.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.59579	137.31045	R4年	Ⅱ	R9年															
中ノ瀬橋	町道	1967	17.5		4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.54693	137.28593	R4年	Ⅱ	R9年															
室山線１号橋	町道	不明	6.2	1	4.4	ボックスカルバート -	白川町	35.66475	137.20148	R4年	Ⅰ	R9年															
室山線２号橋	町道	1964	7.3	1	4.7	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 不明	白川町	35.66632	137.20267	R4年	Ⅰ	R9年															
室山線３号橋	町道	1964	5.5	1	4.8	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.66795	137.2061	R4年	Ⅱ	R9年															
細野線２号橋	町道	1979	6.2	1	4.2	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.65248	137.2161	R4年	Ⅱ	R9年															
砂畑線３号橋	町道	1976	6.5	1	4.9	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.6442	137.22016	R4年	Ⅱ	R9年															
砂畑線４号橋	町道	1976	4.7	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.64293	137.22102	R4年	Ⅱ	R9年															
稲田線１号橋	町道	不明	2.3	1	5.6	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.65468	137.25125	R4年	Ⅰ	R9年															
細尾橋	町道	1977	5.8	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.65786	137.25374	R4年	Ⅰ	R9年															
大津洞橋	町道	1964	12.6	1	3.6	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.64889	137.24079	R4年	Ⅱ	R9年															
みつじ橋	町道	不明	9.4	1	3.4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.65196	137.25027	R4年	Ⅱ	R9年								○			その他補修工	R13年度	R13年度	3.8	
小野橋	町道小野線（その他）	1983	22.6	1	5.2	（鋼）単純桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.681	137.29211	R4年	Ⅱ	R9年															
稲田日陰線３号橋	町道	不明	6.5	1	3.5	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.65266	137.24934	R4年	Ⅰ	R9年															
大津橋	町道	不明	10.7	1	3.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.65074	137.24335	R4年	Ⅱ	R9年															
中落橋	町道	不明	12.1	1	2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.6515	137.24666	R4年	Ⅲ	R9年				△	○						撤去・集約	R9	R10年度	35	地元調整次第撤去
柳屋橋	町道	1969	3.7	1	4.3	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.65983	137.23737	R4年	Ⅱ	R9年															
池田橋	町道	不明	4.8		5.8	ボックスカルバート -	白川町	35.66444	137.24418	R4年	Ⅰ	R9年															
下谷橋	町道	不明	5.1	1	5.6	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.65973	137.23391	R4年	Ⅱ	R9年															
中谷橋	町道	不明	6.2	1	5.6	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.66016	137.23474	R4年	Ⅱ	R9年															
上谷橋	町道	1974	2.9	2	5.9	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.66083	137.23604	R4年	Ⅰ	R9年															
三角森畔線1号橋	町道	不明	6.5	1	8.8	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.66146	137.23497	R4年	Ⅱ	R9年															
高天良橋	町道	不明	6.9	1	1.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.66793	137.24097	R4年	Ⅱ	R9年															
瀬縄手橋	町道中切鱒渕線（その他）	1998	16.5		5.2	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁	白川町	35.59556	137.32111	R4年	Ⅰ	R9年															
室原橋	町道	不明	2.3		7.5	ボックスカルバート -	白川町	35.67191	137.24861	R4年	Ⅰ	R9年															
空谷橋	町道	1976	4.5	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67349	137.25193	R4年	Ⅱ	R9年															
犬押橋	町道	1972	8.4	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.68267	137.26395	R4年	Ⅱ	R9年															
天王橋	町道	不明	8.6	1	3	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.67841	137.26451	R4年	Ⅰ	R9年															
松尾線１号橋	町道	不明	7	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.68119	137.26311	R4年	Ⅱ	R9年															
松尾線２号橋	町道	不明	4.8	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.68402	137.2578	R4年	Ⅰ	R9年															
東洞橋	町道	不明	9		4.5	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋	白川町	35.6775	137.26707	R4年	Ⅱ	R9年															
向山橋	町道	1967	10.3	1	3.3	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.67587	137.26816	R4年	Ⅲ	R9年					●						撤去・集約	近隣BP完成後	-	未定	近隣BP完成後撤去

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
大野線１号橋	町道	不明	3	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67633	137.27808	R4年	II	R9年															
水上橋	町道	不明	4.6	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.67706	137.2804	R4年	II	R9年															
有本日陰橋	町道有本日陰線（◇級）	1998	16.5	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋　逆Ｔ式橋台	白川町	35.68667	137.30167	R4年	I	R9年															
新三掛橋	町道　三掛線(その他)	1980年	37	1	5.5	（鋼）非合成単純鈑桁橋　重力式橋台	白川町	35.64688	137.18915	R3年	I	R8年															
野原橋	町道　鷲原下油井線（2級）	1969年	17.6	1	4.7	（鋼）非合成単純鈑桁橋　重力式橋台	白川町	35.62363	137.18148	R3年	I	R8年															
下畑橋	町道　下畑線(その他)	1970	30.5	1	2.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　不明	白川町	35.58329	137.27739	R3年	II	R8年											鋼材補修工　断面修復工　支承工	R9年度	R9年度	10	I
中島橋	町道　三川新田線(その他)	1975	29.6	1	4.7	（鋼）鋼床版桁　重力式橋台	白川町	35.57293	137.23274	R3年	II	R8年															
広瀬橋	町道　鱒渕日陰線(その他)	1970	32.9	1	3.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.58641	137.34064	R3年	I	R8年															
白川橋	町道　河岐下金線(その他)	1926	115	1	3.9	（鋼）吊橋　重力式橋台　その他橋脚	白川町	35.57961	137.18676	R3年	II	R8年											断面修復、ボルト締付	R8年度	R9年度	29.9	I
大瀬橋	町道　砂畑線(その他)	1963	20.5	1	2.4	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋　不明	白川町	35.64612	137.221	R3年	I	R8年			△○								水切り、断面	R8年度	R8年度	1.3	I
観音橋	町道　小野日陰線（2級）	1971	18	1	4.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　半重力式橋台	白川町	35.67658	137.26836	R4年	I	R9年															
大日女１号橋	町道　大日女線(その他)	1972	30.9	3	1.9	（鋼）連続トラス橋　不明	白川町	35.64892	137.23613	R4年	I	R9年															
隆松橋	町道　古田隆松線(その他)	1962	27.4	1	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋　半重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.57216	137.24217	R3年	II	R8年															
白山橋	町道　村君上油井線（2級）	1980	77	1	6.5	（鋼）単純トラス橋　重力式橋台	白川町	35.63773	137.18521	R3年	I	R8年															
大芹橋	町道　大芹線(その他)	1960	15.6	1	2.5	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋　重力式橋台	白川町	35.54661	137.27747	R3年	I	R8年								○			水回り対策工	R13年度	R13年度	3.1	
飛保橋	町道　飛保線(その他)	1979	40	1	3.8	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.65506	137.19785	R3年	II	R8年															
栗川橋	町道　丑丸中切線(2級)	1972	20	1	4.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台	白川町	35.5438	137.29603	R3年	II	R8年															
鍛治屋敷橋	町道　鍛治屋敷線(その他)	1972	17.5	2	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　逆Ｔ式橋台	白川町	35.54669	137.27538	R3年	II	R8年															
小田橋	町道　小田線(その他)	1987	22.4	1	5.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋(耐候性)　重力式橋台	白川町	35.68931	137.30473	R3年	I	R8年															
上赤河橋	町道　赤河日向線(その他)	1984	20	1	9.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋（耐候性）　逆Ｔ式橋台	白川町	35.55106	137.27021	R3年	I	R8年															
昭和橋	町道　丑丸中切線(2級)	1971	16.8	1	3.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台	白川町	35.54424	137.30273	R3年	I	R8年															
若宮橋	町道　島田若宮線(その他)	1993	21	1	6.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋（耐候性）　逆Ｔ式橋台	白川町	35.59655	137.32453	R3年	III	R8年		○									鋼材補修工	R4年度	R7年度	4.5	I
鹿折小橋	町道　鹿折線(その他)	1976	15.6	1	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台	白川町	35.54274	137.31903	R3年	II	R8年															
中新田橋	町道　中新田日陰線(その他)	1978	25.5	1	5.8	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　逆Ｔ式橋台	白川町	35.58175	137.34999	R3年	II	R8年															
大洞橋	町道　大洞線(その他)	1969	35.5	1	2.9	（鋼）合成単純鈑桁橋　重力式橋台	白川町	35.57632	137.25355	R3年	II	R8年		△	○								遊間異常対策、ひび割れ補修	R7年度	R8年度	8.2	I
道遠畑橋	町道　道遠畑線(その他)	1973	36	1	3.2	（鋼）非合成単純鈑桁橋　重力式橋台	白川町	35.58442	137.26098	R3年	II	R8年															
小倉橋	町道　小倉線(2級)	1983	19.2	1	3.4	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.54768	137.2584	R3年	III	R8年		△		○							撤去・集約	R7年度	R9年度	30	R9年度までに撤去
宮ヶ瀬橋	町道　大日女線(その他)	1976	18.4	1	4.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台	白川町	35.64905	137.23946	R4年	II	R9年															
思案橋	町道　上田線(2級)	1975	26.3	1	5.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋　重力式橋台　T型橋脚	白川町	35.58953	137.20753	R3年	III	R8年				△	○						鋼材補修工　下部工支承工	R9年度	R10年度	40	
大牧橋	町道　大利島線(その他)	1985	35	1	7.5	（鋼）非合成単純鈑桁橋　逆Ｔ式橋台	白川町	35.59842	137.15739	R3年	II	R8年									○		その他補修工	R14年度	R14年度	12.2	
神田橋	町道　小坂線(その他)	1963	66.7	1	3.5	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋　重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.58203	137.2917	R3年	I	R8年								○			漏水対策工	R13年度	R13年度	19.7	
油井公園橋	町道　油井運動場線(その他)	1981	23.7	1	5.5	（鋼）非合成単純鈑桁橋　逆Ｔ式橋台	白川町	35.63823	137.18698	R3年	I	R8年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
中島橋	町道　中島線(その他)	2003	26	1	2.4	（鋼）非合成単純鈑桁橋 重力式橋台	白川町	35.588	137.33757	R3年	Ⅰ	R8年															
宮治橋	町道　奥の洞線(2級)	1978	47.6	3	5	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋 重力式橋台　Ｔ型橋脚	白川町	35.58317	137.29389	R3年	Ⅰ	R8年															
やなじま橋	町道　柳島笹平線(その他)	1971	62.1	1	3.8	（鋼）非合成連続鈑桁橋 重力式橋台　梁式橋脚	白川町	35.59629	137.21822	R4年	Ⅰ	R9年															
永畑橋	町道　永畑線(その他)	1967	27.8	1	3.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台 壁式橋脚	白川町	35.59137	137.29797	R3年	Ⅰ	R8年															
紅葉橋	町道　紅葉端線(その他)	1953	23.2	1	5	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.64938	137.19336	R3年	Ⅱ	R8年															
和泉線１号橋	町道　和泉線(1級)	不明	3	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.59063	137.20465	R3年	Ⅰ	R8年															
落合橋	町道　落合線(その他)	1970	19.4	1	6.25	（鋼）その他のプレートガーダー系橋	白川町	35.59656	137.32081	R3年	Ⅱ	R8年															
広島橋	町道　広島踏切線（2級）	不明	4.3	1	8.8	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.61229	137.1704	R3年	Ⅱ	R8年															
馬橋	町道　馬橋線(その他)	1969	22.4	1	3.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.59469	137.32355	R3年	Ⅱ	R8年															
栃平東線１号橋	町道　栃平東線(その他)	1973	7.4	1	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 不明	白川町	35.55852	137.31228	R3年	Ⅱ	R8年															
高橋	町道　黒川中央線(1級)	1967	18.4	1	5.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.59842	137.32764	R3年	Ⅱ	R8年															
追分橋	町道　切井線(その他)	1952	12.8	1	5	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.54504	137.3058	R3年	Ⅱ	R8年															
中野橋	町道　中野線(その他)	1961	21.2	1	3.5	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋 重力式橋台 壁式橋脚	白川町	35.59384	137.32649	R3年	Ⅱ	R8年								○			主桁　床版　その他	R13年	R13年度	8.1	
赤河線１号橋	町道　赤河線(1級)	不明	5.7	1	5	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.54863	137.25469	R3年	Ⅱ	R8年															
東出橋	町道　向山線(その他)	1970	15.4	1	3.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.60193	137.33355	R3年	Ⅰ	R8年															
赤河線２号橋	町道　赤河線(その他)	不明	3.8	1	4.9	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.54765	137.25961	R3年	Ⅱ	R8年															
島向橋	町道　細野線(その他)	1974	27.5	1	3.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台　Ｔ型橋脚	白川町	35.65464	137.21773	R3年	Ⅱ	R8年															
東谷橋	町道　赤河線(その他)	不明	9.4	1	5.4	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.54795	137.26806	R3年	Ⅰ	R8年															
松ヶ瀬橋	町道　松ヶ瀬線(1級)	1957	54	1	5.1	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋 重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.5839	137.19246	R3年	Ⅱ	R8年					△○	○					床版補修工、下部工その他補修工	R10年度	R11年度	26	
新田橋	町道　山寄新田線(その他)	1954	5	1	4.9	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.57197	137.23681	R3年	Ⅱ	R8年															
寺屋敷橋	町道　寺屋敷線(その他)	1982	39	1	4.7	（鋼）非合成単純鈑桁橋 重力式橋台	白川町	35.64581	137.228	R3年	Ⅱ	R8年															
向島橋	町道　向島線(その他)	1970	20	1	3	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.58571	137.34264	R3年	Ⅰ	R8年															
小坂線３号橋	町道　小坂線(その他)	不明	2.1	1	4.2	（ＲＣ）中実床版橋　不明	白川町	35.57865	137.28787	R3年	Ⅱ	R8年															
天神橋	町道　杉ヶ洞線(その他)	2004	18.5	1	6.5	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.68426	137.29958	R3年	Ⅱ	R8年															
栗の木坂橋	町道　奥の洞線（2級）	1968	10.3	1	5.2	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.57944	137.29914	R3年	Ⅰ	R8年										○	床版、その他	R15年度	R15年度	7.3	
中橋	町道　久田島線(その他)	2000	34	1	6.2	（鋼）非合成単純鈑桁橋（耐候性）　不明	白川町	35.66898	137.24605	R3年	Ⅱ	R8年															
大谷橋	町道　奥の洞支線(その他)	不明	5	1	4	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.57932	137.30191	R3年	Ⅱ	R8年															
成山上橋	町道　三角森畔線(その他)	1975	22.5	1	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.66024	137.23593	R3年	Ⅰ	R8年															
奥洞橋	町道　小坂奥の洞線(その他)	不明	12.6	1	4.8	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.58134	137.29481	R3年	Ⅱ	R8年															
宮ヶ瀬橋	町道　洞田赤羽根線(その他)	1989	27.9	1	5.2	（鋼）非合成単純鈑桁橋（耐候性）　逆Ｔ式橋台	白川町	35.67302	137.25006	R3年	Ⅱ	R8年															
田之向橋	町道　田の向線(その他)	1970	14.5	2	3.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.60349	137.34769	R3年	Ⅱ	R8年															
待瀬橋	町道　小野中野線(その他)	1977	16	1	5.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.67612	137.27251	R3年	Ⅱ	R8年		○									ひびわれ補修工	R7年度	R7年度	28	R7年度補修

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
和良美野橋	町道　切井黒川線(1級)	不明	6	1	3.9	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.59525	137.31293	R3年	Ⅱ	R8年															
菅野橋	町道　大坪線(その他)	1971	15	1	4.2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.68383	137.29846	R3年	Ⅰ	R9年															
林橋	町道　馬橋草場線(その他)	不明	8	1	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.59319	137.32741	R3年	Ⅱ	R8年		△									伸縮装置、水切り材				
下島橋	町道　下島線(その他)	1987	15.6	1	2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.6833	137.29565	R3年	Ⅰ	R8年															
馬橋草場線４号橋	町道　馬橋草場線(その他)	不明	2	1	3.7	（ＲＣ）中実床版橋　重力式橋台	白川町	35.59026	137.33126	R3年	Ⅱ	R8年															
日陰橋	町道　稲田支線(その他)	1975	15.4	1	4.5	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.65089	137.24491	R3年	Ⅱ	R8年															
砂畑橋	町道　砂畑線(その他)	1975	31	1	4.1	（鋼）非合成単純鈑桁橋 重力式橋台	白川町	35.64288	137.22139	R3年	Ⅱ	R8年		○									支承補修工	R7年度	R7年度	37.4	R7年度補修
羽柄橋	町道　羽柄線(その他)	1977	57	1	3.8	（鋼）非合成単純鈑桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.57458	137.20861	R3年	Ⅰ	R8年				△	○							R9年度	R10年度	40	
水戸野橋	町道　水戸野日陰線(その他)	1960	46.8	1	3.1	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台　壁式橋脚	白川町	35.60222	137.23028	R3年	Ⅱ	R8年															
草場橋	町道　小峠草場線(その他)	1981	26.5	3	5	（鋼）非合成単純鈑桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.59118	137.33246	R3年	Ⅰ	R8年															
天神橋	町道　小原両神線(その他)	1970	43	1	9.1	（鋼）非合成単純箱桁橋 重力式橋台	白川町	35.57954	137.1878	R3年	Ⅰ	R8年															
角領橋	町道　角領線(その他)	1981	33.7	1	4.5	（鋼）非合成単純鈑桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.56489	137.22469	R3年	Ⅰ	R8年															
恵津里橋	町道　恵津理線(その他)	1993	52	1	3.8	（鋼）非合成単純鈑桁橋（耐候性）逆Ｔ式橋台　壁式橋脚	白川町	35.60527	137.24663	R3年	Ⅰ	R8年															
段ノ上橋	町道　七曲線(その他)	1968	2.7	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.61005	137.17226	R3年	Ⅱ	R8年															
天神橋	町道　洞口竹腰線(その他)	不明	4	1	4.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.61346	137.16764	R3年	Ⅰ	R8年															
小森橋	町道　洞口竹腰線(その他)	1974	6.2	1	4.1	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.61386	137.16815	R3年	Ⅰ	R8年															
小坂橋	町道　小川線(1級)	不明	3.6	1	6.4	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.62499	137.1634	R3年	Ⅲ	R8年		○									ひびわれ補修工	R7年度	R7年度	2.4	R7年度補修
東洞橋	町道　小川線(1級)	1972	6	1	5.1	（ＲＣ）中空床版橋　（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.62578	137.15933	R3年	Ⅱ	R8年															
西ヶ洞橋	町道　小川線(一級)	1967	6.3	1	4.8	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.6262	137.15599	R3年	Ⅰ	R8年															
苅畑橋	町道　久田島橋線(その他)	1982	28.4	1	4	（鋼）非合成単純鈑桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.66492	137.24354	R3年	Ⅱ	R8年															
巻渕橋	町道　小川線(一級)	1977	11.4	1	4.9	（ＰＣ）プレテンション単純中空床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.62421	137.15318	R3年	Ⅰ	R8年															
小川線５号橋	町道　小川線(1級)	1977	9.4	1	4.8	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.62017	137.14833	R3年	Ⅰ	R8年															
小川線６号橋	町道　小川線(1級)	1977	9.5	1	4.8	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.61745	137.14668	R3年	Ⅰ	R8年															
小川線７号橋	町道　小川線(1級)	1978	8.7	1	4.8	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋 重力式橋台	白川町	35.61647	137.14515	R3年	Ⅰ	R8年															
小川線８号橋	町道　小川線(1級)	1969	8.4		4.1	（ＰＣ）プレテンション単純床版桁橋	白川町	**35.61564**	137.14448	R3年	Ⅰ	R8年															
宮井戸橋	町道　小川東洞線(その他)	不明	2.9	1	12.6	ボックスカルバート　（ＲＣ）中実床版橋　-　不明	白川町	35.62856	137.1579	R3年	Ⅰ	R8年															
小川西ヶ洞線1号橋	町道　小川西ヶ洞線(その他)	1976	7.7	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.6263	137.15594	R3年	Ⅰ	R8年									○		その他補修工	R14年度	R14年度	3.5	
小川西ヶ洞線２号橋	町道　小川西ヶ洞線(その他)	1973	5.1	1	3.6	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.62769	137.1549	R3年	Ⅱ	R8年															
横田線１号橋	町道　横田線(その他)	不明	9.6	1	4.1	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.62258	137.15109	R3年	Ⅱ	R9年															
新津橋	町道　新津線(2級)	1970	6.4	1	4	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.62604	137.17075	R3年	Ⅱ	R9年															
出合橋	町道　小川出合線(その他)	1969	18.3	1	1.9	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.62437	137.16511	R3年	Ⅱ	R8年															
村君橋	町道　桴場高岩線(その他)	不明	4.9	1	3.9	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.63576	137.18159	R3年	Ⅰ	R8年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
広島橋	町道　広島踏切線(その他)	不明	4.3	1	8.8	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.61275	137.16878	R3年	Ⅱ	R8年															
小川東洞２号線１号橋	町道　小川東洞２号線(その他)	不明	5.8	1	4	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.62666	137.15833	R3年	Ⅰ	R8年															
新垣橋	町道　山寄線(その他)	1970	9.5	1	4	（ＲＣ）単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.57225	137.23787	R3年	Ⅰ	R8年															
藤井下平線１号橋	町道　藤井下平線(その他)	不明	2	1	3.2	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.56775	137.22	R3年	Ⅰ	R8年															
大洞小橋	町道　大洞線(その他)	1972	6.5	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.57687	137.25375	R3年	Ⅰ	R8年															
三川日陰線２号橋	町道　三川日陰線(その他)	1977	4	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.56021	137.22923	R3年	Ⅰ	R8年															
下平線３号橋	町道　下平線(その他)	1969	3.9	1	5.4	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.56306	137.23222	R3年	Ⅰ	R8年															
古田隆松線１号橋	町道　古田隆松線(その他)	1960	4	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.55741	137.24334	R3年	Ⅱ	R8年															
袖平線１号橋	町道　袖平線(その他)	1969	6.5	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.57215	137.24373	R3年	Ⅰ	R8年															
河東橋	町道　坂ノ東野原線(その他)	1984	108.7	1	5.5	（鋼）単純トラス橋　（鋼）非合成単純鈑桁橋 重力式橋台　T型橋脚	白川町	35.62047	137.16273	R3年	Ⅰ	R8年							○				床版補修　その他補修工	R12年度	R12年度	27.9	
袖平線２号橋	町道　袖平線(その他)	1969	2.7	1	3.4	（ＲＣ）中実床版橋 石積み橋台	白川町	35.56956	137.24754	R3年	Ⅰ	R8年															
下古野日向線１号橋	町道　下古野日向線(2級)	不明	4.3	1	4.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.54906	137.25922	R3年	Ⅲ	R8年	○										断面修復工	R6年度	R6年度	27.5	R6年度補修済
水穴橋	町道　水穴線(2級)	不明	2.5	1	5.7	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.55397	137.26957	R3年	Ⅰ	R8年															
上日向線１号橋	町道　上日向線(その他)	不明	2.9	1	3.3	（ＲＣ）中実床版橋 重力式橋台	白川町	35.5535	137.26459	R3年	Ⅱ	R8年															
小倉線２号橋	町道　小倉線(2級)	1973	8.7	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.54547	137.25829	R3年	Ⅰ	R8年															
丑丸中切線２号橋	町道　丑丸中切線(2級)	1972	7.5	1	4.5	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.54242	137.29399	R3年	Ⅰ	R8年															
神棚橋	町道　本郷追分線(その他)	1973	12.6	1	4.8	（ＰＣ）プレテンション単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.54442	137.30699	R3年	Ⅱ	R8年															
水口橋	町道　切井黒川線(1級)	1970	12.6	1	4.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.54639	137.30785	R3年	Ⅱ	R8年							○				主桁、伸縮の防食機能　支承工	R12年度	R12年度	7.7	
稲葉橋	町道　切井黒川線(1級)	1972	5		4.3	（ＲＣ）中実床版橋 不明	白川町	35.55089	137.30959	R3年	Ⅱ	R8年															
落合橋	町道　藤井下平線(その他)	1970	21.2	1	2	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.56664	137.22262	R3年	Ⅱ	R8年															
三川日陰橋	町道　三川日陰線(その他)	1969	23.5	1	3.7	（鋼）その他のプレートガーダー系橋 重力式橋台	白川町	35.56181	137.22805	R3年	Ⅱ	R8年											鋼材補修、塗替え	R7年度	R8年度	9	
島大橋	町道　大利島線(その他)	1985	133.2	1	5.5	（鋼）非合成単純鈑桁橋　（鋼）トラスドランガー桁橋 逆Ｔ式橋台　T型橋脚	白川町	35.59891	137.15798	R3年	Ⅰ	R8年											ひびわれ補修工	R8年度	R9年度	22.9	Ⅰ
南門橋	みちくさ２号線	不明	3.5	1	3.5	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.63003	137.18416	R元年	Ⅰ	R6年															
界橋	三掛金山線	1973	2.7	1	4.3	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.64551	137.18081	R元年	Ⅰ	R6年															
小原橋	上小原線	1998	59.2	1	10.1	鋼連続Ｉ桁橋(耐候性) 重力式橋台、梁式橋脚	白川町	35.58517	137.19896	R元年	Ⅱ	R6年					△○						伸縮、塗装塗替え	R8年度	R8年度	26.5	Ⅰ
下宇津尾線１号橋	下宇津尾線	不明	3	1	3.3	RC単純床版橋 不明	白川町	35.62226	137.19636	R元年	Ⅰ	R6年															
下宇津尾線２号橋	下宇津尾線	不明	2.9	1	3.3	RC単純床版橋 不明	白川町	35.62096	137.20343	R元年	Ⅰ	R6年															
両神田代線１号橋	両神田代線	不明	7.4	1	5	RC床版橋 重力式橋台(継ぎ足し部：ブロック積)	白川町	35.59369	137.18534	R元年	Ⅱ	R6年															
両神田代線２号橋	両神田代線	不明	3.6	1	3.3	RC床版橋 重力式橋台	白川町	35.59306	137.18297	R元年	Ⅱ	R6年															
みどの観音橋	中川下油井線	2006	125.2	1	7.7	鋼連続箱桁橋(耐候性) 逆Ｔ式橋台、梁式橋脚	白川町	35.60388	137.22785	R元年	Ⅰ	R6年															
大山橋	中川下油井線	2012	24.2	1	8.2	ＰＣ単純コンポ桁橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.63425	137.18412	R元年	Ⅰ	R6年															
小草場橋	中川下油井線	2012	103.4	1	7.7	鋼連続I桁橋(耐候性) 逆Ｔ式橋台、梁式橋脚	白川町	35.60346	137.22318	R元年	Ⅰ	R6年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
１号立体ラーメン桟道杭式道路	中川下油井線	不明	41.5	1	8.2	鋼製桟道橋(耐候性) 小橋台、鋼管杭基礎	白川町	35.60374	137.22535	R元年	Ⅰ	R6年								○			下部工　支承工	R13年度	R13年度	2.3	
２号立体ラーメン桟道杭式道路	中川下油井線	不明	35.5	1	8.2	鋼製桟道橋(耐候性) 小橋台、鋼管杭基礎	白川町	35.60382	137.22462	R2年	Ⅰ	R7年															
中川橋	井ノ洞線	1967	55	1	4.3	鋼単純CT桁橋 重力式橋台、壁式橋脚	白川町	35.6122	137.25121	R元年	Ⅱ	R6年		△	○								支承工　その他補修	R7年度	R8年度	8.6	
井ノ洞線２号橋	井ノ洞線	不明	8.4	1	5.8	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 不明	白川町	35.61042	137.25282	R元年	Ⅱ	R6年															
井ノ洞線３号橋	井ノ洞線	不明	7.4	1	4	RC単純床版橋 不明	白川町	35.60817	137.25368	R元年	Ⅱ	R6年															
井ノ洞線４号橋	井ノ洞線	不明	7	1	3.8	RC床版橋 不明	白川町	35.60665	137.25476	R元年	Ⅰ	R6年															
中切橋	使者見中宇津尾線	不明	6	1	3.3	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.62164	137.20596	R元年	Ⅰ	R6年															
使者見線１号橋	使者見線	不明	4.9	1	3.3	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.6171	137.20385	R元年	Ⅰ	R6年															
和泉小坂線１号橋	和泉小坂線	1971	8.4	1	4.1	鋼単純I桁橋 不明	白川町	35.59184	137.21025	R元年	Ⅱ	R6年		△	○								床版の断面修復	R7	R8	15	
和泉小坂線２号橋	和泉小坂線	1973	5.3	1	3.5	RC床版橋 不明	白川町	35.59423	137.21288	R元年	Ⅰ	R6年															
和泉白山線２号橋	和泉白山線	不明	4.4	1	5.3	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.60156	137.20631	R元年	Ⅰ	R6年															
吹洞橋	和泉線	不明	6.7	1	4.5	ＰＣ単純プレテンション床版橋（Ｉ桁） 重力式橋台	白川町	35.59119	137.20755	R元年	Ⅰ	R6年															
小坂橋	和泉線	不明	10.2	1	5.1	RC単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.59106	137.20954	R元年	Ⅰ	R6年															
大相模橋	大相模線	不明	5	1	3	RC床版橋 A1,A2共練ブロック積(不明)	白川町	35.57866	137.19084	R元年	Ⅰ	R6年															
宇津尾無渡線２号橋	宇津尾無渡線	不明	8.5	1	4.5	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.62887	137.21355	R元年	Ⅰ	R6年															
小沼橋	宇津尾無渡線	不明	7.6	1	6.2	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 重力式橋台	白川町	35.61883	137.20097	R元年	Ⅰ	R6年															
小井戸大野台線１号橋	小井戸大野台線	不明	8	1	5.9	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版橋(I桁)、RC床版橋 不明	白川町	35.57851	137.19426	R元年	Ⅰ	R6年															
小井戸大野台線２号橋	小井戸大野台線	不明	7.5	1	6.8	RC床版橋、ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋（Ｉ桁） 重力式橋台	白川町	35.57855	137.19445	R元年	Ⅲ	R6年		○						○			断面修復工	R7年度	R7年度	4.5	R7年度補修　R13までに横桁補修
小井戸大野台線３号橋	小井戸大野台線	不明	6.95	1	9.3	ＲＣ床版橋 重力式橋台	白川町	35.57651	137.19838	R元年	Ⅱ	R6年															
登竜橋	小井戸大野台線	1975	8.6	1	6.8	ＰＣ単純プレテンション床版橋(Ｉ桁) 重力式橋台	白川町	35.57433	137.20105	R元年	Ⅰ	R6年															
両神橋	小原両神線	不明	8	1	5.7	RC単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.58101	137.18769	R元年	Ⅱ	R6年							○				橋面防水、断面修復	R12年度	R12年度	4.1	
岩穴橋	小原島兼線	1938	26.4	2	5.5	３径間単純（ＲＣ床版橋＋ＲＣＴ桁橋＋ＲＣ床版橋）不明、壁式橋脚	白川町	35.58341	137.19947	R元年	Ⅱ	R6年									○		排水管補修、断面修復	R14年度	R14年度	5.8	
小山橋	小原駐車場線	1978	20.2	1	4.7	ＰＣ単純プレテンション床版橋 重力式橋台	白川町	35.57982	137.18826	R元年	Ⅱ	R6年										○	主桁　横桁　床版その他補修	R15年度	R15年度	9.7	
東山橋	島線	不明	4	1	3.5	ＲＣ床版橋 不明	白川町	35.60646	137.17194	R元年	Ⅰ	R6年															
葛牧橋	広島葛牧線	1986	97.1	1	5.7	鋼連続Ｉ桁橋 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚	白川町	35.61166	137.17787	R元年	Ⅰ	R6年										○	その他補修工	R15年度	R15年度	15.4	
新水戸野橋	新水戸野線	1982	60	1	5	２径間ＰＣ単純Ｔ桁橋 重力式橋台、壁式橋脚	白川町	35.60145	137.22621	R元年	Ⅰ	R6年									○		その他補修工	R14年度	R14年度	9.8	
つつじ橋	柳島笹平線	1993	15.5	1	6.2	鋼単純H桁橋(耐候性) 重力式橋台	白川町	35.59353	137.2216	R元年	Ⅰ	R6年															
てまり橋	柳島笹平線	1993	11.6	1	6.5	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 逆Ｔ式橋台	白川町	35.59298	137.22613	R元年	Ⅰ	R6年															
ふれあい橋	柳島笹平線	1993	15.9	1	8.2	鋼単純Ｈ桁橋(耐候性) 逆T式橋台	白川町	35.59478	137.21863	R元年	Ⅰ	R6年															
もみじ橋	柳島笹平線	1993	13	1	6.5	PC単純プレテンション中空床版橋 逆Ｔ式橋台	白川町	35.59354	137.22217	R元年	Ⅰ	R6年															
栃本橋	栃本線	不明	10.2	1	1.5	ＲＣ床版橋 不明	白川町	35.59539	137.20691	R元年	Ⅱ	R6年															
清水橋	永引線	不明	3.7	1	3.5	RC床版橋 A1,A2共練石積(不明)	白川町	35.58279	137.17978	R元年	Ⅰ	R6年															

３ 白川町橋梁個別施設計画

※本計画は、定期点検結果及び予算措置状況など必要に応じ見直しを行っていきます。

施設名	路線	架設年次	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋梁形式	起点側の位置			直近の点検結果		次回点検年	修繕計画（設計：△　工事：○）										対策内容	対策の着手年	完了予定年	対策に係る全体概算事業費（百万円）	備考
道路橋名	路線名						管内	緯	経	点検年	判定区分 Ⅰ～Ⅳ		R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)					
洞山橋	洞山線	1971	10.3	1	4.7	鋼単純Ｉ桁橋 不明	白川町	35.62038	137.24849	R元年	II	R6年								○			主桁・横桁　支承工	R13年度	Ｒ13年度	4.4	
洞山線２号橋	洞山線	1971	4	1	4.7	RC床版橋 不明	白川町	35.62212	137.2472	R元年	I	R6年															
洞山線３号橋	洞山線	1973	7.6	1	4.5	RC床版橋 不明	白川町	35.62517	137.24521	R元年	I	R6年															
洞山線４号橋	洞山線	不明	6	1	3.9	RC単純床版橋 不明	白川町	35.62707	137.24418	R元年	I	R6年															
無渡線１号橋	無渡線	1966	10.6	1	3.3	RC単純Ｔ桁橋 重力式橋台	白川町	35.63698	137.18769	R元年	III	R6年											断面修復工	R5年度	R5年度	30	R5年度補修済
第２新橋	第二新橋線	不明	7.8	1	2.1	鋼単純H桁橋 不明	白川町	35.5915	137.20764	R元年	II	R6年															
葛牧見代線１号橋	葛牧見代線	1984	6	1	5.9	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.61027	137.1874	R元年	I	R6年															
葛牧見代線２号橋	葛牧見代線	不明	9.1	1	6.6	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 逆Ｔ式橋台	白川町	35.60934	137.18894	R元年	I	R6年															
葛牧見代線３号橋	葛牧見代線	不明	6.9	1	6.4	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 重力式橋台	白川町	35.60873	137.18893	R元年	I	R6年															
葛牧見代線４号橋	葛牧見代線	不明	7	1	6.4	PC単純プレテンション床版橋(I桁) 重力式橋台	白川町	35.60864	137.18924	R元年	I	R6年															
須崎橋	須崎神社線	1976	12.6	1	3.3	ＲＣ単純Ｔ桁橋 不明	白川町	35.6142	137.25264	R元年	I	R6年															
飛保線２号橋	飛保線	不明	6.2	1	4.1	RC単純床版橋 不明	白川町	35.65534	137.1986	R元年	I	R6年															
高校グランド線１号橋	高校グランド線	1975	5.4	1	4.9	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.57194	137.20189	R元年	I	R6年															
船渡洞橋	鷲原下油井線	1972	5.9	1	4.4	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.62308	137.17433	R元年	I	R6年															
鷲原下油井線２号橋	鷲原下油井線	1969	3.3	1	4.3	RC単純床版橋 不明	白川町	35.61246	137.18304	R元年	I	R6年															
鷲原下油井線３号橋	鷲原下油井線	不明	3.6	1	4.6	RC単純床版橋 重力式橋台	白川町	35.61241	137.17994	R元年	II	R6年															
